



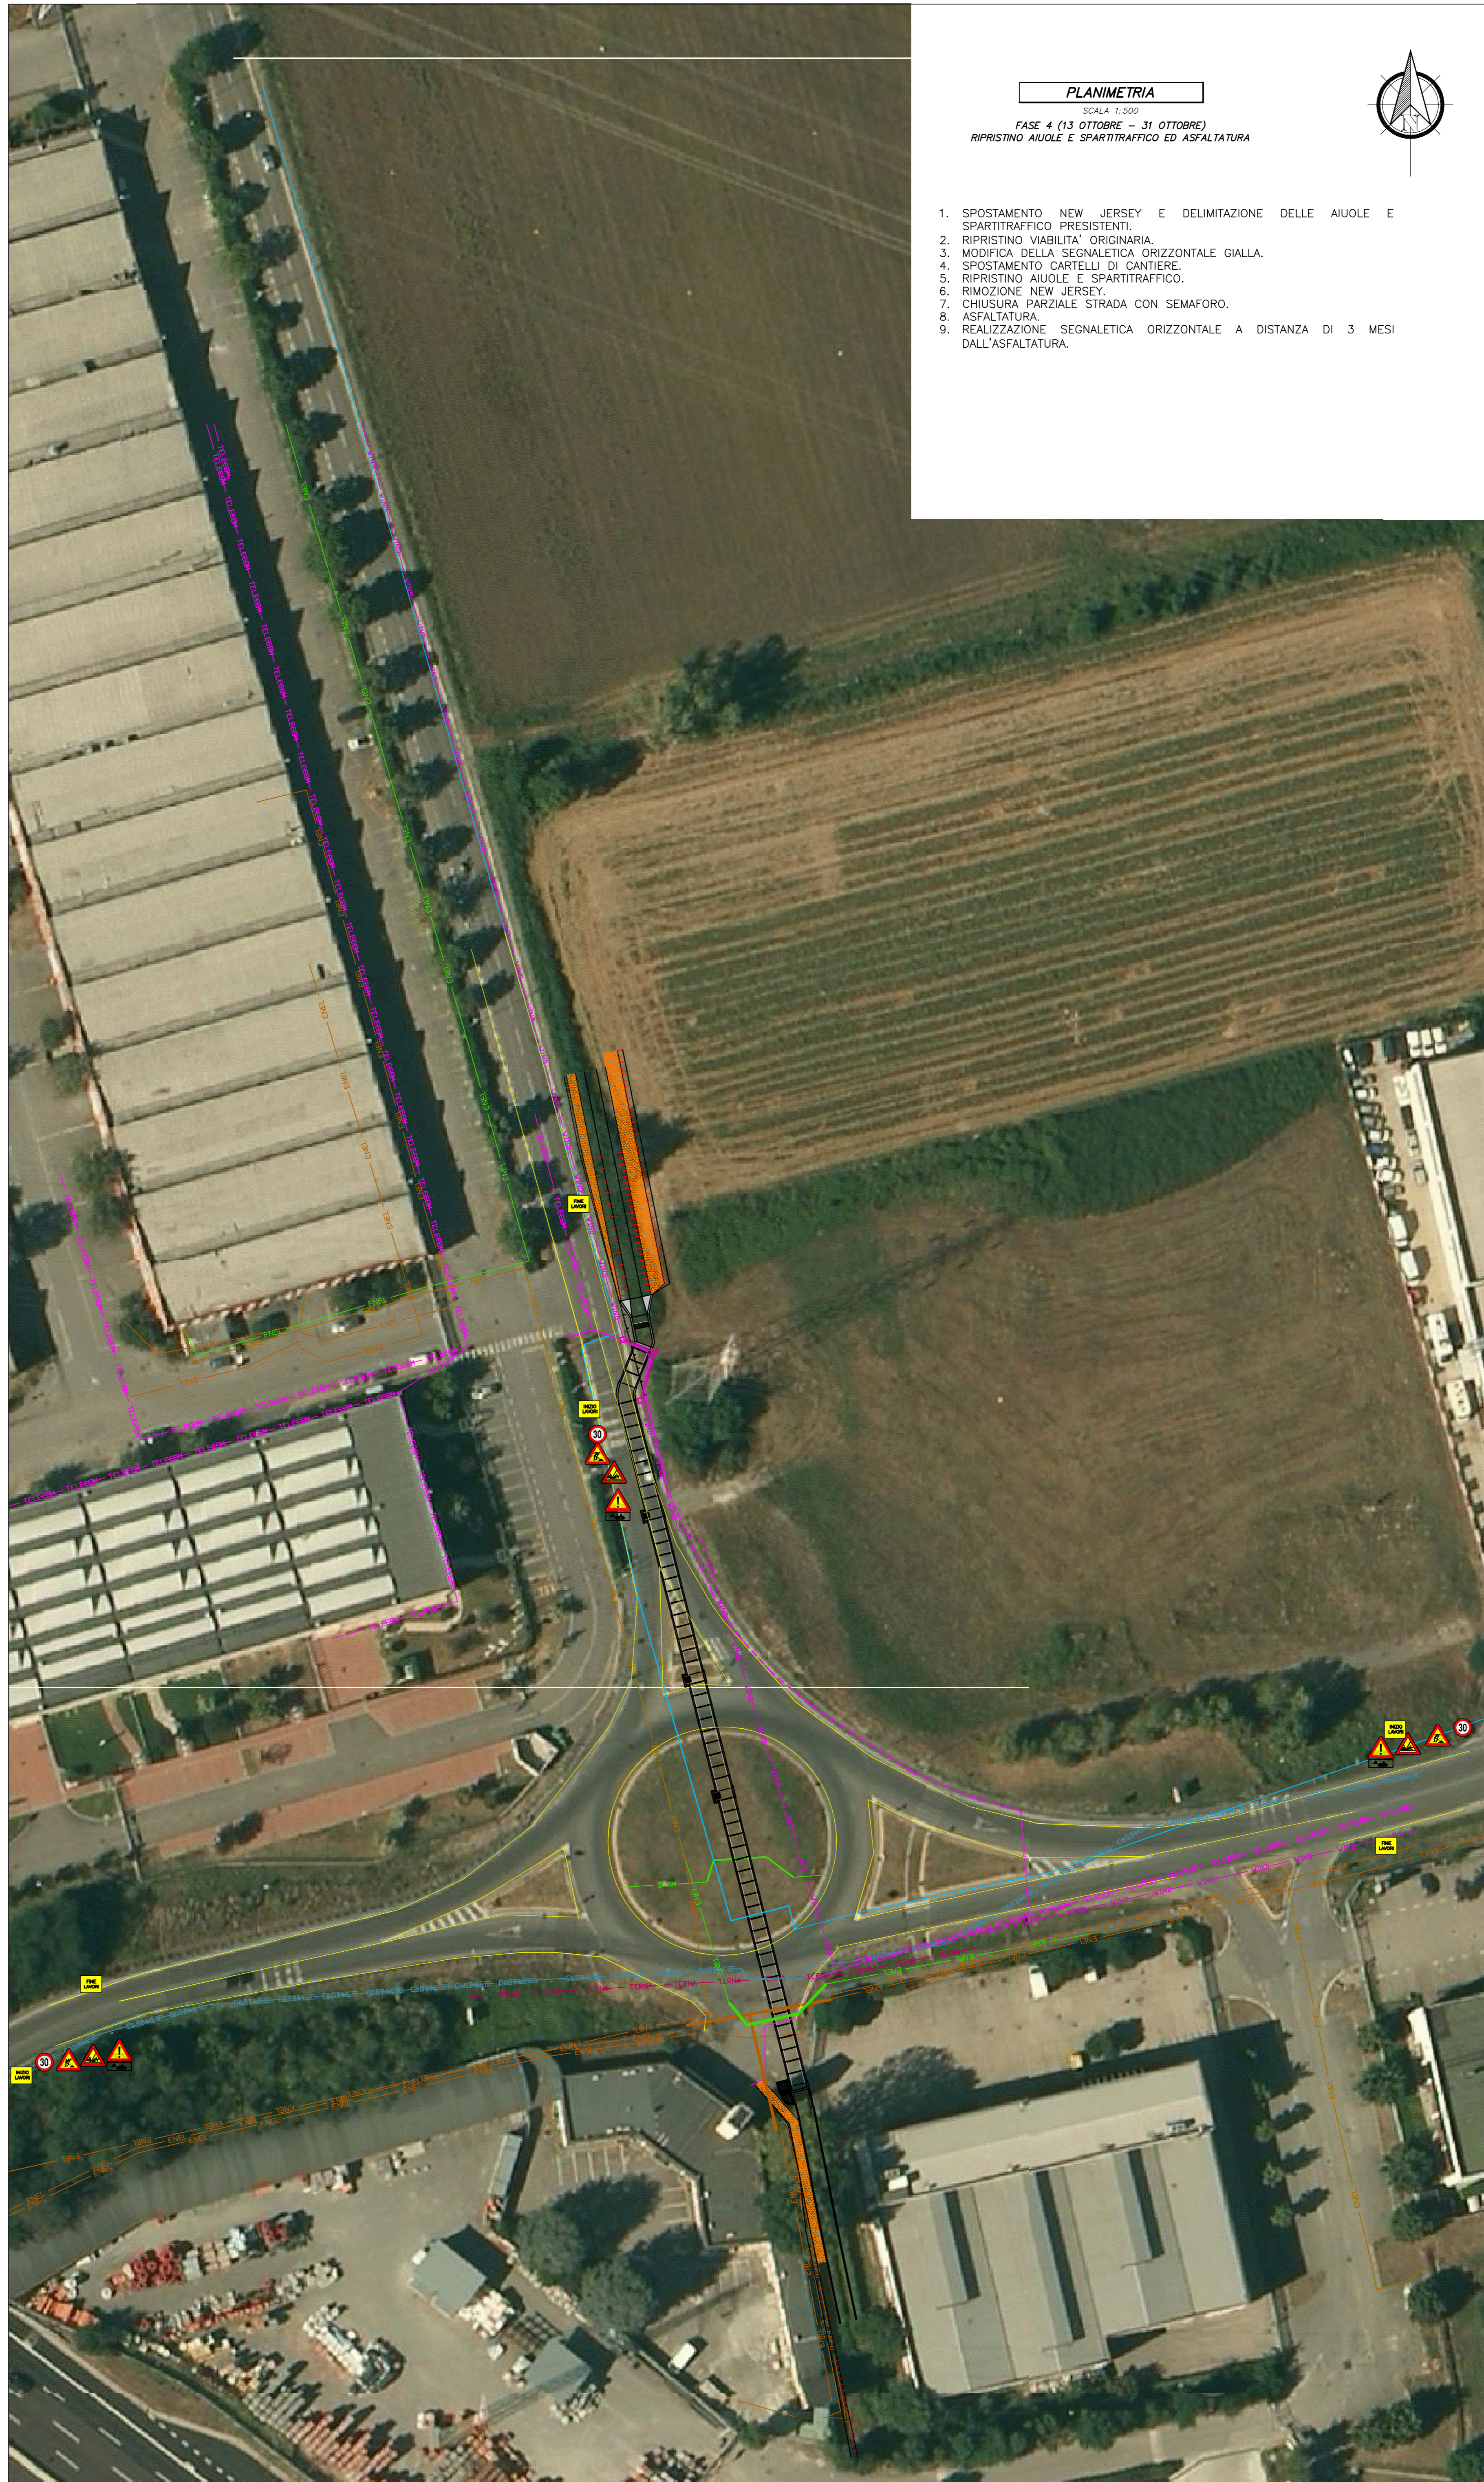


PLANIMETRIA
SCALA 1:500
FASE 3 (15 SETTEMBRE - 13 OTTOBRE)
INTERVENTI A SUD DELLA ROTATORIA

1. SPOSTAMENTO DEL NEW JERSEY E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA.
2. MODIFICA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE GIALLA.
3. MODIFICA DELLA SEGNALETICA VERTICALE.
4. RIPRISTINO DEL SENSO DI MARCIA IN VIA MONTE GRAPPA E VIE ALL'INTERNO DEI CAPANNONI.
5. REALIZZAZIONE DEL TOMBINO NEL TRATTO A SUD DELLA ROTONDA.



PLANIMETRIA
SCALA 1:500
FASE 4 (13 OTTOBRE - 31 OTTOBRE)
RIPRISTINO AIUOLE E SPARTITRAFFICO ED ASFALTATURA



1. SPOSTAMENTO NEW JERSEY E DELIMITAZIONE DELLE AIUOLE E SPARTITRAFFICO PRESISTENTI.
2. RIPRISTINO VIABILITA' ORIGINARIA.
3. MODIFICA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE GIALLA.
4. SPOSTAMENTO CARTELLI DI CANTIERE.
5. RIPRISTINO AIUOLE E SPARTITRAFFICO.
6. RIMOZIONE NEW JERSEY.
7. CHIUSURA PARZIALE STRADA CON SEMAFORO.
8. ASFALTATURA.
9. REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE A DISTANZA DI 3 MESI DALL'ASFALTATURA.



LEGENDA

- RETI DI SOTTOSERVIZI ESISTENTI CON INDICAZIONE DEI GESTORI (LE LINEE CON LE QUOTE INDICANO I SOTTOSERVIZI EFFETTIVAMENTE POSIZIONATI CON TRACCIAMENTO)
- TRACCIATO ESISTENTE DELL'ACQUEDOTTO RILEVATO MEDIANTE STRUMENTAZIONE
- AREE DI CANTIERE
- NEW JERSEY DI PLASTICA
- SEGNALETICA GIALLA DI CANTIERE

KEY-MAP VIA D'ACQUA
SCALA 1:20.000

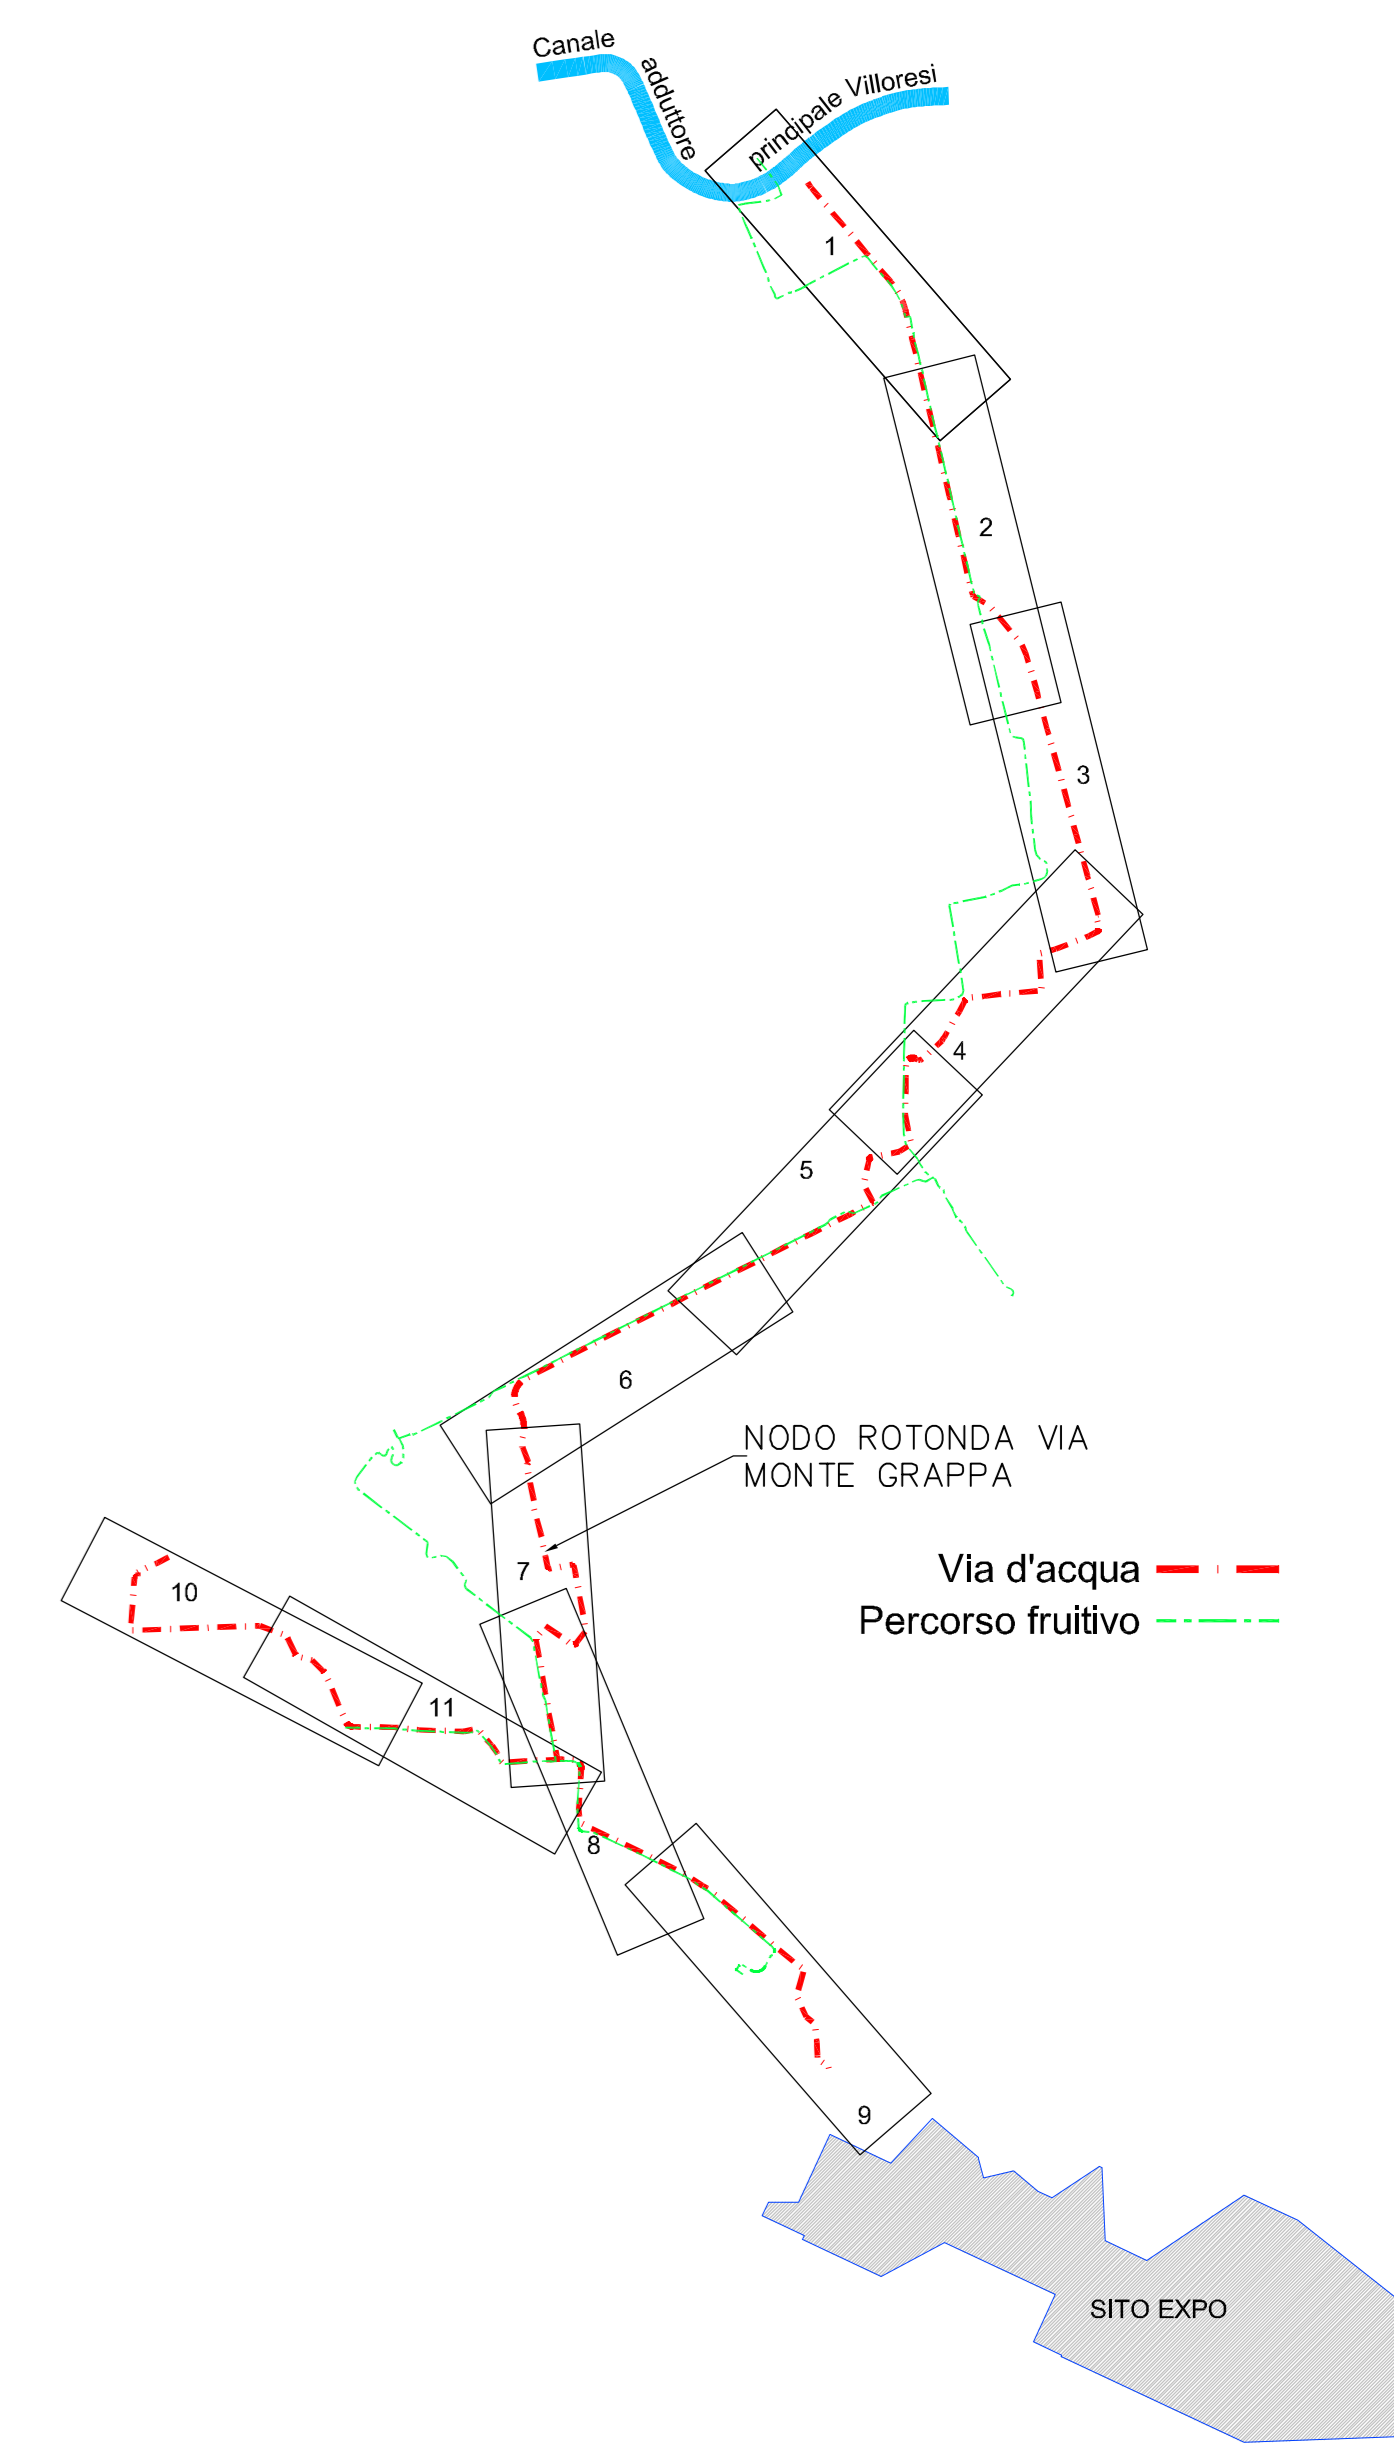

PROGETTO VIE D'ACQUA
Canale della Via d'Acqua - Secondaria Villorosi - Tratto Nord
Canale adduttore e percorso dal Villorosi al Sito Expo
DIREZIONE LAVORI
2013-2015

NODO ROTONDA VIA MONTE GRAPPA
FASI DI CANTIERE - TAV.2

EXPO 2105 S.p.A.
RESPONSABILE DEI LAVORI: dott. ing. Alessandro Molaloni
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Carlo Chiesa

EST TICINO VILLORESI
DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
dott. ing. Stefano Burchielli

SUPPORTO AL D.L. E AL C.S.E.

APPALTATORE: **ALTENE** (Mandatario) Via J. Zanardi, 372 Bologna (BO)

PP/8 (Mandatario) Via Kennedy, 3 Corteforata (PV)

IMPRESA ARROS (Mandatario) Via Kennedy, 3 Corteforata (PV)

ELABORAZIONE: **DL.05**

SCALA	1:500		
DATA	04.06.2014		
CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REDAZIONE	APPROVATO
ESISTENTE	DL.05 - NODO ROTONDA VIA MONTE GRAPPA - STATO DI FATTO, PROGETTO E LAVORI DI CANTIERE	ALTENE	ISB
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDAZIONE
01	21.05.2014	INTERVENTI SNAM	ALTENE
02	04.06.2014	RIUNIONE 26 MAGGIO 2014	ALTENE
			ISB
